

La cartera de proyectos

Marzo de 2020

Dr. Francisco José García Peñalvo

Grupo de investigación en InterAcción y eLearning (GRIAL)
Universidad de Salamanca

fgarcia@usal.es
<http://grial.usal.es>
<http://twitter.com/frangp>



VNiVERSiDAD
D SALAMANCA

CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL




¿Qué es una cartera de proyectos TI?



MÁSTER UNIVERSITARIO
INGENIERÍA INFORMÁTICA

Colección de proyectos/programas y otro tipo de iniciativas
que se encuentran agrupadas
con el objetivo de facilitar su gestión efectiva
de cara a conseguir las metas estratégicas de la organización




La cartera de proyectos TI (CdP-TI)



MÁSTER UNIVERSITARIO
INGENIERÍA INFORMÁTICA

- Incluye los proyectos TI a desarrollar en un año
- Es una buena práctica dentro del gobierno de las TI
- Permite conocer las necesidades globales de organización en cuanto a Tecnologías de la Información
- Permite planificar sus soluciones con la suficiente antelación



Proyectos TI




MÁSTER UNIVERSITARIO
INGENIERÍA INFORMÁTICA

Son proyectos que tienen como objetivo
poner en marcha un servicio

que podrá ofrecerse gracias a que cuenta con soporte tecnológico

No son solo aquellos proyectos que tienen como objetivo
poner en marcha un servicio puramente tecnológico




Objetivos de la CdP-TI




MÁSTER UNIVERSITARIO
INGENIERÍA INFORMÁTICA

1. Alinear la estrategia de TI con la estrategia global de la organización
2. Determinar cuáles son los objetivos estratégicos más importantes en los que invertir en TI
3. Establecer cuáles son las necesidades tecnológicas de la organización
4. Establecer la prioridad de los proyectos TI a llevar a cabo
5. Determinar el valor que proporcionan las TI a la organización





Elementos de una CdP-TI

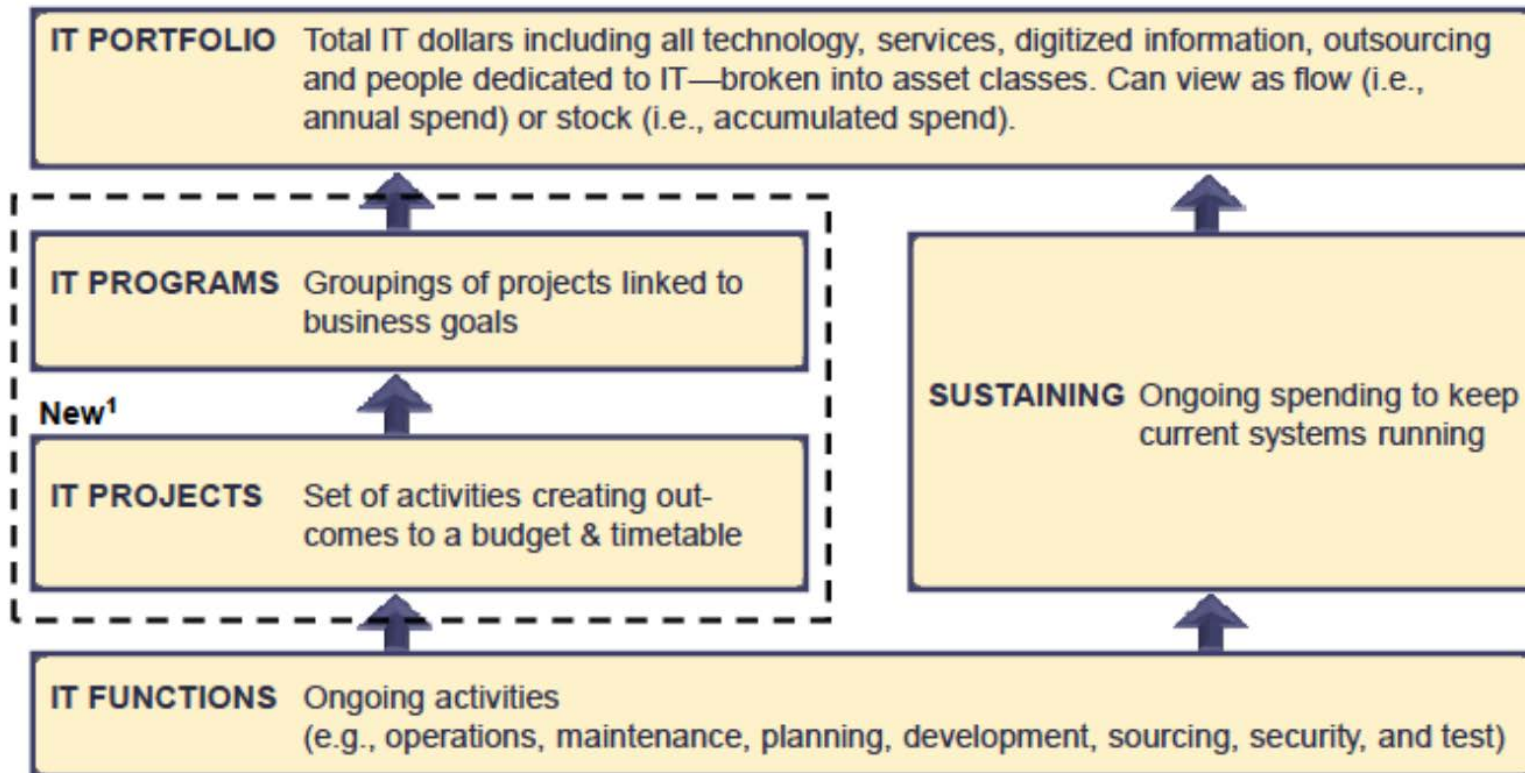

¹Firms who spend more of their total IT spend on new initiatives (dashed box) had statistically significantly higher industry adjusted growth and margins – MIT CISR study, July 2008 (95 firms).


Source: MIT CISR study of 1508 firms in late 2007 (Weill & Woerner).

Equilibrio entre nuevas iniciativas y mantenimientos




MÁSTER UNIVERSITARIO
INGENIERÍA INFORMÁTICA

**NUEVAS INICIATIVAS
DE NEGOCIO**

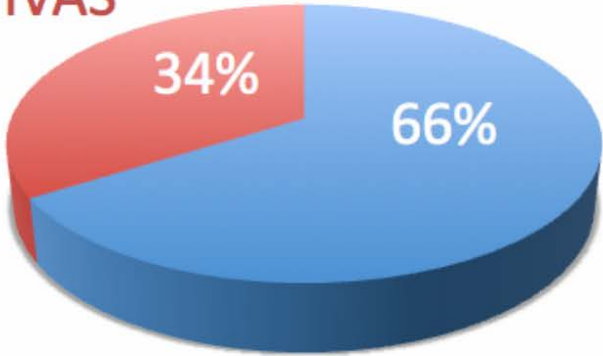

**SOSTENIBILIDAD
DEL NEGOCIO**




Pasos para implantar una CdP-TI



www.pmi.org



MÁSTER UNIVERSITARIO
INGENIERÍA INFORMÁTICA

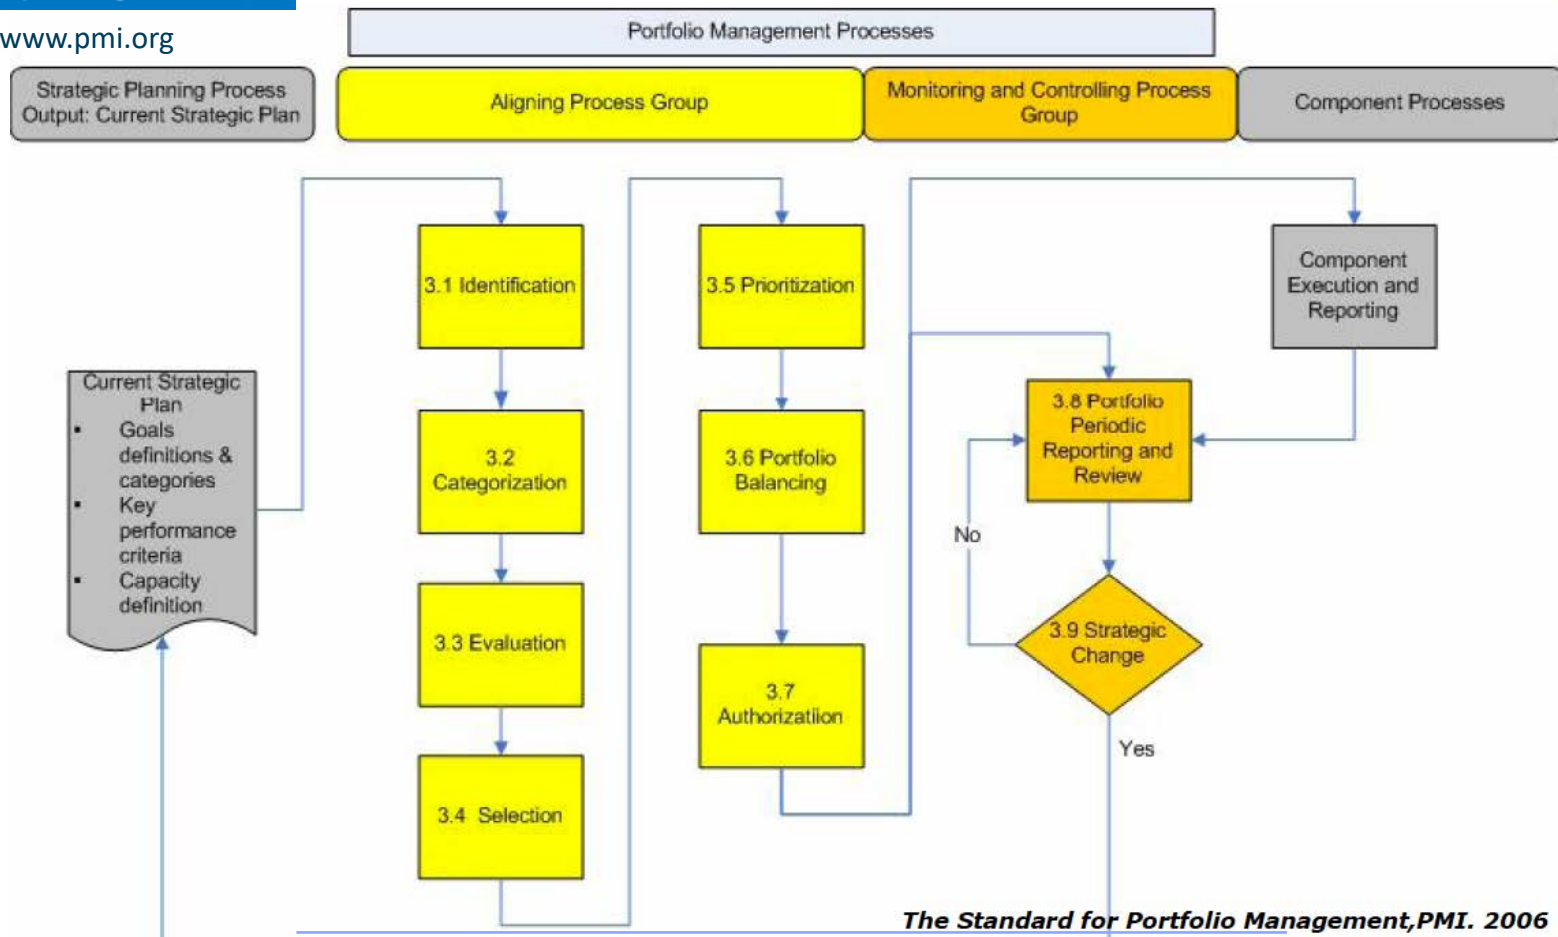


The Standard for Portfolio Management, PMI. 2006

Pasos para implantar una CdP-TI



MÁSTER UNIVERSITARIO
INGENIERÍA INFORMÁTICA

- 1. Configurar
- 2. Confeccionar
- 3. Priorizar
- 4. Ejecutar



Pasos para implantar una CdP-TI


1. Configurar

1. ¿Con qué recursos financieros se cuenta?
2. ¿Con qué recursos humanos se cuenta?
3. ¿Cuáles son los criterios de evaluación de los Proyectos TI?
4. ¿Qué información debe aportar cada propuesta de Proyecto TI?

2. Confeccionar

3. Priorizar

4. Ejecutar



Pasos para implantar una CdP-TI



MÁSTER UNIVERSITARIO
INGENIERÍA INFORMÁTICA


1. Configurar

2. Confeccionar

1. Publicar la agenda de la Cartera de Proyectos TI
2. Periodo de presentación de propuestas
3. Evaluación de las propuestas

3. Priorizar

4. Ejecutar




Pasos para implantar una CdP-TI

1. Configurar
2. Confeccionar
- 3. Priorizar**
 1. Priorización e inversión
 2. Publicación de los proyectos aprobados
4. Ejecutar



MÁSTER UNIVERSITARIO
INGENIERÍA INFORMÁTICA




Pasos para implantar una CdP-TI

1. Configurar
2. Confeccionar
3. Priorizar
4. Ejecutar

1. Seguimiento del éxito de los proyectos TI



MÁSTER UNIVERSITARIO
INGENIERÍA INFORMÁTICA




Agentes implicados en la CdP-TI

- Promotor
- Director de proyecto
- Apoyo técnico
- Director de TI (CIO)
- Equipo de Gobierno



MÁSTER UNIVERSITARIO
INGENIERÍA INFORMÁTICA




Agentes implicados en la CdP-TI

- Promotor

Es la persona que propone el proyecto y defiende la necesidad de su ejecución

- Director de proyecto
- Apoyo técnico
- Director de TI (CIO)
- Equipo de Gobierno



Agentes implicados en la CdP-TI




MÁSTER UNIVERSITARIO
INGENIERÍA INFORMÁTICA

- Promotor
- Director de proyecto

Es la persona asignada por el Promotor del proyecto para la dirección y ejecución posterior del mismo y tendrá la responsabilidad de conseguir los objetivos propuestos. Debe ser un responsable funcional

- Apoyo técnico
- Director de TI (CIO)
- Equipo de Gobierno






Agentes implicados en la CdP-TI

- Promotor
- Director de proyecto
- Apoyo técnico

En la Unidad de Informática se designarán una o varias personas que podrán asesorar (en los aspectos técnicos) al Promotor y al Director del proyecto en la elaboración de la propuesta

- Director de TI (CIO)
- Equipo de Gobierno






Agentes implicados en la CdP-TI

- Promotor
- Director de proyecto
- Apoyo técnico
- Director de TI (CIO)

Responsable de aclarar a los promotores cualquier duda relacionada con la CdP, recibirá todas las solicitudes, las evaluará y elevará una propuesta de priorización al Equipo de Gobierno

- Equipo de Gobierno




Agentes implicados en la CdP-TI



MÁSTER UNIVERSITARIO
INGENIERÍA INFORMÁTICA

- Promotor
- Director de proyecto
- Apoyo técnico
- Director de TI (CIO)
- **Equipo de Gobierno**

Encargado de establecer la financiación y los criterios para establecer la prioridad de los proyectos. Analizará las solicitudes, determinará su prioridad y confeccionará la cartera de proyectos final



Ideas clave




MÁSTER UNIVERSITARIO
INGENIERÍA INFORMÁTICA

La cartera de proyectos es solo una herramienta que sirve para afianzar una cultura previamente adquirida

Esa cultura y los elementos que la componen es lo que se llama...

Buen gobierno (en general)
y **Gobierno de las TI** (en particular)



Ejemplo



MÁSTER UNIVERSITARIO
INGENIERÍA INFORMÁTICA

prezi.com/gies0lirz3rw/cartera-de-proyectos-de-ti-en-la-universitat-dalacant

IMPULSANDO EL
GOBIERNO DE LAS TI
MEDIANTE UNA
CARTERA DE PROYECTOS DE LAS TI

Prezi
Tus prezis Aprende y ayuda Explora Nuevo prezi Faraón Lloren...

Universidad d'Alacant
IMPULSANDO EL
GOBIERNO DE LAS TI
MEDIANTE UNA
CARTERA DE PROYECTOS DE LAS TI

4. Ejecutar
3. Priorizar
2. Confeccionar
1. Configurar

Editar Presenta a distancia Descargar Guardar una copia Compartir Insertar Public

Cartera de Proyectos de TI en la Universitat d'Alacant

Sin descripción

de Antonio Fernández Martínez el 3 de abril de 2014 • 1 [Twitter](#) 0


Más presentaciones de
Antonio Fernández Martínez

Bibliografía



MÁSTER UNIVERSITARIO
INGENIERÍA INFORMÁTICA

- A. Fernández Martínez, “Modelo de Gobierno de las TI para Universidades (GTI4U),” en *Gobierno de las TI para universidades*, A. Fernández Martínez y F. Llorens-Largo, Eds. pp. 145-159, Madrid, España: Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, 2012
- A. Fernández Martínez. (2016). *Impulsando el gobierno de las TI mediante una cartera de proyectos de las TI*. Disponible en: <https://goo.gl/PNpcgQ>




Agradecimientos

Esta lección está adaptada de

Llorens Largo, F. (2014). La Cartera de Proyectos TI



MÁSTER UNIVERSITARIO
INGENIERÍA INFORMÁTICA



La cartera de proyectos

Marzo de 2020

Dr. Francisco José García Peñalvo

Grupo de investigación en InterAcción y eLearning (GRIAL)
Universidad de Salamanca

fgarcia@usal.es
<http://grial.usal.es>
<http://twitter.com/frangp>



VNiVERSiDAD
D SALAMANCA

CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL

